



Управление культуры администрации  
Белгородского района

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

# «Развитие детского творчества на территории Белгородского района «ДЕТСКАЯ КНИГА В КАЖДЫЙ ДОМ»

Начальник Управления культуры администрации  
Белгородского района  
**Калашник Юлия Васильевна**

г. Белгород, 2018 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Библиотечная сеть обслуживания детского населения Белгородского района

Территория Белгородского района занимает 1400,514 км<sup>2</sup>, на которой проживают 116546 жителей в 86 населенных пунктах. На территории района проживает 18800 жителей-детей, 89 % которых охвачены библиотечным обслуживанием в 24 поселениях.

Библиотечная сеть Белгородского района представлена 40 библиотеками-филиалами. Библиотечные услуги детям предоставляют 2 специализированные детские библиотеки и 36 общедоступных библиотек, обслуживающих в том числе и читателей-детей.

Две библиотеки-филиалы не предоставляют услуги детям : филиал № 39 «Дубовская поселенческая библиотека» и филиал № 1 Октябрьская поселенческая библиотека», так как на территории поселения действуют специализированные детские библиотеки: Детская районная библиотека и филиал № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека».



**Таким образом, из 86 населенных пунктов Белгородского района в 48 населенных пунктах района библиотечные услуги детям не предоставляются.**

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


## Библиотечная сеть обслуживания детского населения Белгородского района

<b>Всего библиотек</b>		<b>40</b>		
Центральная районная библиотека				
Районная детская библиотека				
Библиотеки-филиалы		<b>38</b>		
из них				
Детских	<b>2</b>	Детская районная библиотека Филиал № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека»		
Модельных	<b>19 (+0 к 2018г.)</b>	Бессоновская Разуменская№36 Разуменская№37 Новосадовская Крутологская Тавровская	Майская Никольская Дубовская Малиновская Северная Яснозоренская Октябрьская №1	Головинская Комсомольская Мясоедовская Хохловская Пушкарская Октябрьская№2
из них	<b>2</b>	Тавровская библиотека имени Ю.Н.Говорухо-Отрока		
Библиотека - музей		Мясоедовская библиотека-музей «Мясоедовское подполье»		

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Населенные пункты Белгородского района, не охваченные библиотечным обслуживанием:

Беловское с.п. -	село Севрюково – 540 чел. село Ястребово – 169 чел.
Беломестненское с.п. -	поселок Северный-Первый – 242 село Шишино – 551
Бессоновское с.п. -	хутор Быстрый - 22 село Николаевка – 130 село Орловка – 369 село Чайки – 260
Весёллопанское с.п. -	хутор Водяной – 17 село Долбино – 486 хутор Угрим- 57
Головинское с.п. -	село Бехлевка – 35 село Болдыревка – 73 село Варваровка – 173 село Новая Нелидовка – 305 село Салтыково – 60 село Соловьевка – 46 село Старая Нелидовка – 49
Дубовское с.п. -	село Репное – 535 село Шагаровка – 93
Ериковское с.п. -	хутор Березово – 17 хутор Гонки – 106 хутор Зачатеевка – 40 село Раково – 57

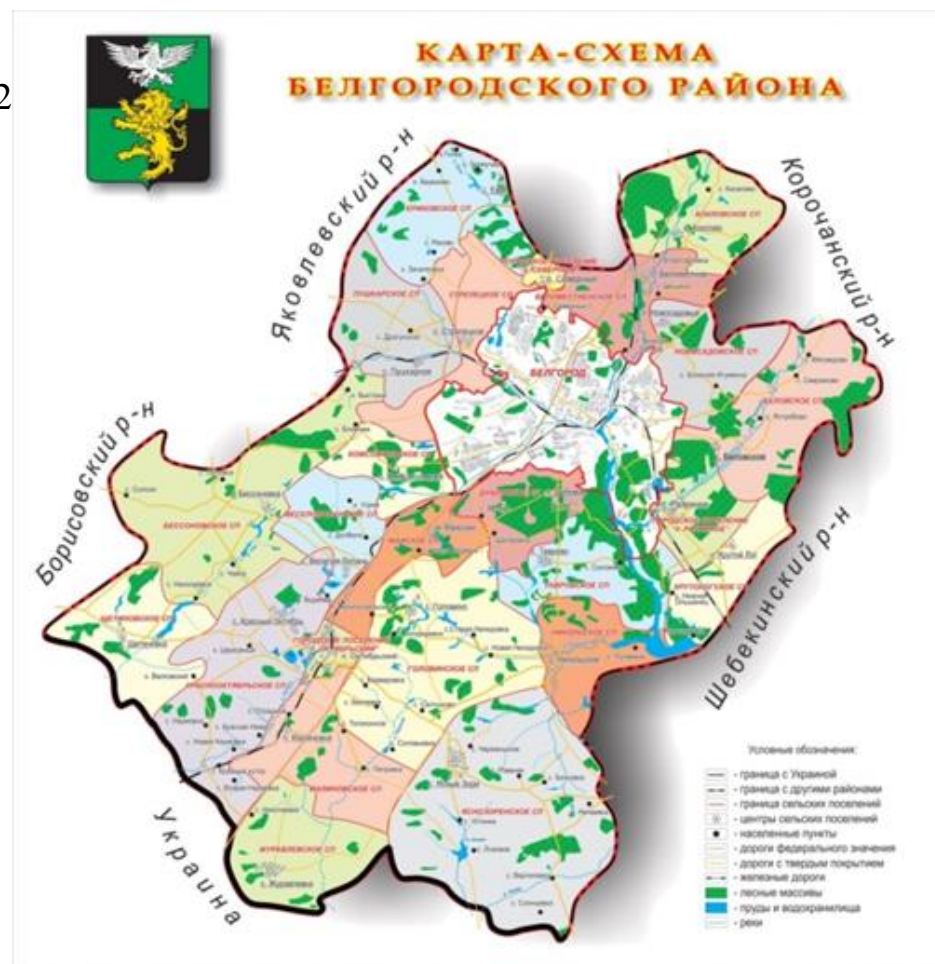




# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


## Населенные пункты Белгородского района, не охваченные библиотечным обслуживанием:

Журавлёвское с.п. -	хутор Нехотеевка- 162
Комсомольское с.п. -	село Красное – 80
Краснооктябрьское с.п. -	село Вторая Наумовка - 37
	село Красная Нива – 77
	село Наумовка – 89
	село Новая Наумовка – 169
	хутор Церковный – 38
Крутологское с.п. -	село Карнауховка – 80
	село Нижний Ольшанец – 325
Майское с.п. -	село Новая Деревня – 202
Малиновское с.п. -	село Отрадное – 745
	село Толоконное – 86
Никольское с.п. -	село Пуляевка – 126
Пушкарское с.п. -	село Драгунское – 766
Тавровское с.п. -	село Соломино – 56
Щетиновское с.п. -	хутор Валковский – 116
Яснозоренское с.п. -	село Вергилевка – 132
	село Лозовое – 48
	село Нечаевка – 426
	село Ровенек – 97
	село Солнцевка – 36
	село Устинка – 251

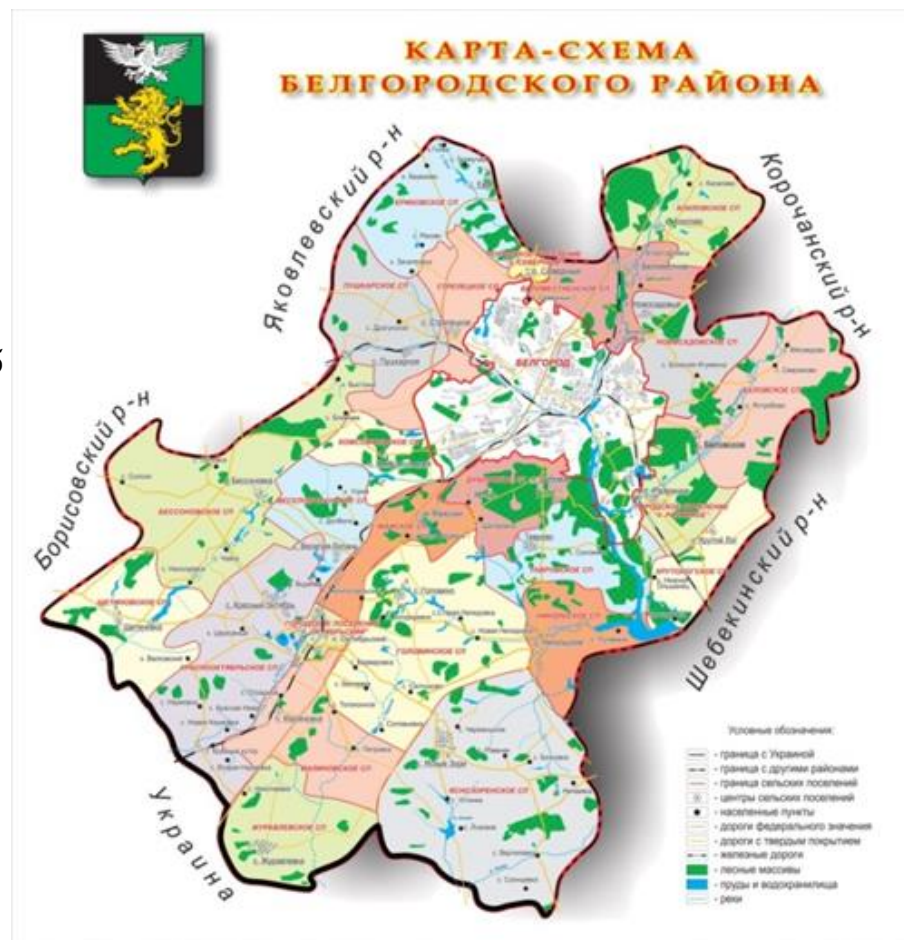

## ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Фонд детской литературы в библиотеках Белгородского района на 01.01.2018 г. Составляет 140043 тыс. экземпляров. При этом около 30% состава фонда является ветхим и устаревшим по содержанию. Нормативом закупки для читателя-ребенка является 30% от общего поступления фонда в библиотеки. Для того, чтобы улучшить качество детского фонда библиотек Белгородского района необходимо увечить норматив, так как анализ ситуации показывает, что закупаемой литературы согласно нормативу недостаточно для удовлетворения спроса.

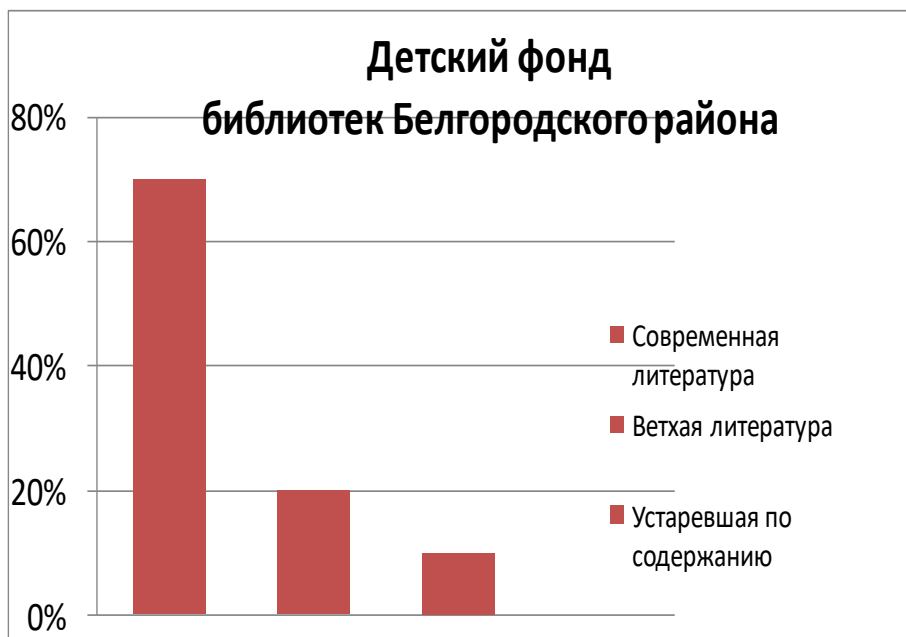

**2018 год объявлен Годом детского чтения в Белгородской области в соответствии с Распоряжением Губернатора Белгородской области от 5 декабря 2017 года №983 «О проведении в Белгородской области в 2018 году Года детского чтения».**

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	К декабрю 2018 года увеличить охват библиотечным обслуживанием жителей-детей Белгородского района на не менее 167 пользователей, по соотношению к числу пользователей 2017 года (16.735)
<b>Способ достижения цели проекта:</b>	Организация цикла мероприятий для детского населения Белгородского района, в том числе в труднодоступных и малонаселенных пунктах, с помощью КИБО (библиобус), приобретение детской литературы и планшетных устройств
<b>Результат проекта:</b>	Не менее 16902 жителей-детей Белгородского района охвачены библиотечным обслуживанием
<b>Требования к результату проекта:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обеспечено строительство учреждения культуры в с. Зелёная Поляна площадью не менее 351 м.</li><li>2. Приобретен Комплекс информационно-библиотечного обслуживания.</li><li>3. Приобретена детская литература на сумму не менее 540 тыс. рублей.</li><li>4. Приобретены не менее 10 электронных компактных планшетных компьютерных устройств.</li><li>5. Среди не менее 10.000 жителей-детей Белгородского района проведен соцопрос «Удовлетворенность жителей Белгородского района библиотечным обслуживанием жителей-детей»;</li><li>6. Организовано не менее 20 выездов Комплекса информационно-библиотечного обслуживания в 48 населенных пунктах Белгородского района, не имеющих стационарных библиотек.</li><li>7. Проведено не менее 3 районных конкурса детского чтения и творчества.</li><li>8. Проведено не менее 2 акций по продвижению детского чтения.</li><li>9. Создана база данных «Современные писатели - детям».</li><li>10. Составлен сборник «Детская книга в каждый дом».</li><li>11. Проведена информационная кампания:<ul style="list-style-type: none"><li>- опубликовано не менее 10 статей в СМИ;</li><li>- опубликовано не менее 5 пост-релизов в социальных сетях;</li><li>- опубликовано не менее 4 статей на официальном сайте администрации Белгородского района.</li></ul></li></ol>
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Жители Белгородского района.

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Длительность дней	Дата начала	Дата окончания	2018											
					05	06	07	08	09	10	11	12				
<b>1.</b>	<b>Анализ ситуации в области библиотечного обслуживания детей в Белгородском районе «выполнено»</b>	<b>55</b>	<b>17.05.2018</b>	<b>01.08.2018</b>												
1.1	Проведение соопроса «Удовлетворенность жителей Белгородского района библиотечным обслуживанием жителей-детей» «выполнено»	55	17.05.2018	01.08.2018												
1.2	Формирование списка населенных пунктов, нуждающихся в библиотечном обслуживании детей Белгородского района. «выполнено»	14	13.07.2018	01.08.2018												
<b>2.</b>	<b>Приобретение комплекса библиотечно-информационного обслуживания.</b>	<b>83</b>	<b>15.05.2018</b>	<b>10.09.2018</b>												
2.1	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения торгов «выполнено»	14	15.05.2018	01.06.2018												
2.2	Проведение процедуры торгов. Заключение контракта. «выполнено»	58	21.06.2018	10.09.2018												
<b>3.</b>	<b>Процедура государственной регистрации Комплекса информационно-библиотечного обслуживания.</b>	<b>155</b>	<b>10.05.2018</b>	<b>14.12.2018</b>												
3.1	Процедура государственной регистрации Комплекса информационно-библиотечного обслуживания «выполнено»	8	01.09.2018	10.09.2018												
3.2	Формирование и утверждение плана проведения мероприятий Комплекса информационно-библиотечного обслуживания. «выполнено»	8	01.09.2018	10.09.2018												
3.3	Размещение информации о разработке проекта на сайте Управления культуры администрации Белгородского района; Вконтакте - группа «Культурное сообщество Белгородского района», Социальных группах библиотек Белгородского района «выполнено»	59	10.05.2018	01.08.2018												
3.4	Организация и проведения цикла выездных мероприятий по обслуживанию детей	74	31.08.2018	14.12.2018												
3.4.1	Организация и проведение цикла выездных мероприятий по обслуживанию детей в 3 кв. 2018 года	21	31.08.2018	28.09.2018												
3.4.2	Организация и проведение цикла выездных мероприятий по обслуживанию детей в 4 кв. 2018 года	54	01.10.2018	14.12.2018												
<b>4.</b>	<b>Приобретение детской литературы «выполнено»</b>	<b>52</b>	<b>21.05.2018</b>	<b>01.08.2018</b>												
4.1	Анализ детского фонда библиотек Белгородского района «выполнено»	52	21.05.2018	01.08.2018												
4.2	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения торгов «выполнено»	30	21.05.2018	02.07.2018												
4.3	Проведение процедуры торгов . Заключение контракта.	52	21.05.2018	01.08.2018												



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Длительность дней	Дата начала	Дата окончания	2018								
					05	06	07	08	09	10	11	12	
<b>5.</b>	<b>Приобретение электронных персональных компьютеров и компактных планшетных компьютерных устройств «выполнено»</b>	<b>14</b>	<b>27.06.2018</b>	<b>16.07.2018</b>									
<b>5.1</b>	<b>Приобретение компактных планшетных устройств. «выполнено»</b>	<b>14</b>	<b>27.06.2018</b>	<b>16.07.2018</b>									
5.1.1	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения процедуры торгов по закупке компактных планшетных устройств «выполнено»	14	27.06.2018	16.07.2018									
5.1.2	Проведение процедуры торгов по закупке компактных планшетных устройств. Заключение контракта «выполнено»	14	27.06.2018	16.07.2018									
<b>5.2.</b>	<b>Приобретение персональных компьютеров. «выполнено»</b>	<b>14</b>	<b>27.06.2018</b>	<b>16.07.2018</b>									
5.2.1	Анализ наличия парка компьютерной техники в библиотеках Белгородского района «выполнено»	14	27.06.2018	16.07.2018									
5.2.2	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения процедуры торгов по закупке ПК «выполнено»	14	27.06.2018	16.07.2018									
5.2.3	Проведение процедуры торгов по закупке ПК. Заключение контракта. «выполнено»	14	27.06.2018	16.07.2018									
5.3	Утверждение списка библиотек, нуждающихся в планшетных устройствах и новых ПК «выполнено»	7	06.07.2018	16.07.2018									
<b>6.</b>	<b>Организация мероприятий в рамках Года детского чтения</b>	<b>159</b>	<b>21.05.2018</b>	<b>31.12.2018</b>									
<b>6.1</b>	<b>Проведение районного конкурса «Самая читающая семья Белгородского района!»</b>	<b>116</b>	<b>21.05.2018</b>	<b>30.10.2018</b>									
6.1.1	Разработка положения конкурса, утверждение состава жюри. ("выполнено")	15	21.05.2018	08.06.2018									
6.1.2	Проведение и подведение итогов районного конкурса «Самая читающая семья Белгородского района»	22	01.10.2018	30.10.2018									
<b>6.2</b>	<b>Организация и проведение мероприятия «Страна Литературия» ("выполнено")</b>	<b>19</b>	<b>15.05.2018</b>	<b>08.06.2018</b>									
6.2.1	Разработка сценария районного праздника, посвященный Дню защиты детей «Страна Литературия» ("выполнено")	14	15.05.2018	01.06.2018									
6.2.2	Приобретение рамок и грамот для процедуры награждения("выполнено")	14	15.05.2018	01.06.2018									

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Длительность дней	Дата начала	Дата окончания	2018											
					05	06	07	08	09	10	11	12				
6.2.3	Проведение и награждение участников районного праздника, посвященного Дню защиты детей «Страна Литературия» ("выполнено")	6	01.06.2018	08.06.2018												
<b>6.3</b>	<b>Организация и проведение районной акции «Подари ребенку книгу»</b>	<b>58</b>	<b>15.05.2018</b>	<b>01.09.2018</b>												
6.3.1	Разработка положения акции и сроков проведения акции("выполнено")	14	15.05.2018	01.06.2018												
6.3.2	Информирование жителей района о предстоящей акции посредством размещений афиш, информации в сети Интернет, сайте Управление культуры администрации Белгородского района; Вконтакте - группа «Культурное сообщество Белгородского района», Социальных группах библиотек Белгородского района("выполнено")	14	15.05.2018	01.06.2018												
6.3.3	Проведение и подведение итогов акции «Подари ребенку книгу!»	58	01.06.2018	01.09.2018												
<b>6.4</b>	<b>Организация и проведение Интернет-акции, «Читающий район» посвященной 90-летию со Дня образования Белгородского района</b>	<b>85</b>	<b>04.05.2018</b>	<b>03.09.2018</b>												
6.4.1	Разработка положения акции и сроков проведения акции("выполнено")	18	04.05.2018	30.05.2018												
6.4.2	Информирование жителей района об акции посредством размещений афиш, информации в сети Интернет, сайте Управление культуры администрации Белгородского района; Вконтакте - группа «Культурное сообщество Белгородского района», социальных группах библиотек Белгородского района.	50	26.06.018	03.09.2018												
6.4.3	Информирование учащихся школ и педагогического коллектива о проведении Интернет- акции, «Читающий район», посвященной 90-летию со Дня образования Белгородского района("выполнено")	18	04.05.2018	30.05.2018												
6.4.4	Размещение информации о проведении Интернет-акции на сайте Управления образования Белгородского района	14	15.08.2018	03.09.2018												

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Длительность дней	Дата начала	Дата окончания	2018							
					06	07	08	09	10	11	12	
6.4.5	Приобретение рамок и грамот для процедуры награждения.	14	15.08.2018	03.09.2018								
6.4.6	Проведение и подведение итогов Интернет - акции, «Читающий район», посвященной 90-летию со Дня образования Белгородского района.	14	15.08.2018	03.09.2018								
<b>6.5</b>	<b>Организация и проведение районного фестиваля «Восславим тебя, Белгородский район!» «выполнено»</b>	<b>28</b>	<b>11.06.2018</b>	<b>20.07. 2018</b>								
6.5.1	Разработка положения районного фестиваля чтецов «Восславим тебя, Белгородский район» «выполнено»	24	11.06.2018	16.07.2018								
6.5.2	Разработка сценария районного фестиваля чтецов «Восславим тебя, Белгородский район» «выполнено»	24	11.06.2018	16.07.2018								
6.5.3	Информирование жителей района о предстоящем районном фестивале посредством размещения афиш, информации в сети Интернет, сайте Управление культуры администрации Белгородского района; Вконтакте - группа «Культурное сообщество Белгородского района», социальных группах библиотек Белгородского района «выполнено»	28	11.06.2018	20.07.2018								
6.5.4	Сбор заявок на участие в фестивале чтецов «Восславим тебя, Белгородский район!» «выполнено»	24	11.06.2018	16.07.2018								
6.5.5	Приобретение рамок и грамот для процедуры награждения	14	03.07.2018	20.07.2018								
6.5.6	Проведение и подведение итогов районного фестиваля чтецов «Восславим тебя, Белгородский район!»	14	03.07.2018	20.07.2018								

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Длительность дней	Дата начала	Дата окончания	2018			2019																	
					10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11							
<b>7.</b>	<b>Строительство и торжественное открытие учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)</b>	<b>233</b>	<b>12.12.2018</b>	<b>01.11.2019</b>																					
7.1	Разработка технического задания.	58	12.12.2018	01.03.2019																					
7.2	Разработка проектно-сметной документации.	58	12.12.2018	01.03.2019																					
7.3	Экспертиза проектно-сметной документации.	58	12.12.2018	01.03.2019																					
7.4	Строительные работы во возведению здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	58	02.03.2019	22.05.2019																					
7.5	Строительные работы по кровельной отделке здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	48	23.05.2019	29.07.2019																					
7.6	Строительные работы по внутренней отделке здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	26	29.07.2019	02.09.2019																					
7.7	Ввод в эксплуатацию здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	44	01.09.2019	01.11.2019																					
7.8	Разработка сценария и проведение литературно-музыкального праздника «Приключения в Солнечном городе» к 110-летию Н. Носова, посвященного торжественному Открытию учреждения культуры.	24	01.10.2019	01.11.2019																					
7.9	Организация и проведение литературно-музыкального праздника «Приключения в Солнечном городе» к 110-летию Н. Носова, посвященного торжественному Открытию учреждения культуры.	24	01.10.2019	01.11.2019																					
<b>8.</b>	<b>Создание базы данных «Современные писатели – детям»</b>	<b>115</b>	<b>09.10.2018</b>	<b>29.03.2019</b>																					
8.1	Анализ ситуации укомплектованности библиотек современной детской литературой по возрастам	55	09.10.2018	25.12.2018																					
8.2	Сбор и редакция материала, техническое составление базы данных.	73	27.11.2018	19.03.2019																					

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Длительность дней	Дата начала	Дата окончания	2018			2019										
					10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
8.3	Проведение семинара «Современные писатели – детям» для специалистов поселенческих библиотек	9	19.03.2019	29.03.2019														
8.4	Составление методических рекомендаций «Как превратить чтение в удовольствие»	42	15.01.2019	15.03.2019														
8.5	Размещение базы данных на сайте МУК «ЦБ Белгородского района», социальных страницах библиотек Белгородского района	8	20.03.2019	29.03.2019														
<b>9.</b>	<b>Создание сборника «Детская книга в каждый дом»</b>	<b>122</b>	<b>09.04.2019</b>	<b>30.09.2019</b>														
9.1	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения торгов	23	09.04.2019	14.05.2019														
9.2	Процедура проведения торгов. Заключение контракта.	28	14.05.2019	21.06.2019														
9.3	Набор, верстка и печать сборника «Детская книга в каждый дом» по итогам проекта сбор информации	57	20.06.2019	06.09.2019														
9.4	Презентация Сборника «Детская книга в каждый дом» сотрудникам библиотек Белгородского района	15	10.09.2019	30.09.2019														
9.5	Размещении Сборника «Детская книга в каждый дом» по итогам проекта на сайте МУК «ЦБ Белгородского района» и странице Детской районной библиотеке	15	10.09.2019	30.09.2019														
<b>10.</b>	<b>Организация и проведение торжественного Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе</b>	<b>21</b>	<b>03.12.2018</b>	<b>31.12.2018</b>														
10.1	Приобретение звукоусилительного и светового оборудования для АУК «Майский ДК»	17	03.12.2018	25.12.2018														
10.2	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения процедуры торгов по закупке звукоусилительного и светового оборудования для АУК «Майский ДК»	7	03.12.2018	11.12.2018														
10.3	Проведение процедуры торгов звукоусилительного и светового оборудования для Майского ДК	14	06.12.2018	25.12.2018														
10.4	Разработка сценария Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе	14	03.12.2018	20.12.2018														
10.5	Информирование жителей района о предстоящем празднике посредством размещений афиш, информации в сети Интернет, сайте Управления культуры администрации Белгородского района; Вконтакте - группа «Культурное сообщество Белгородского района», Социальных группах библиотек Белгородского района	17	03.12.2018	25.12.2018														



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Длительно сть дней	Дата начала	Дата окончания	2018							2019												
					05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
10.6	Формирование и утверждение списка награждаемых в рамках Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе	17	03.12.2018	25.12.2018																				
10.7	Информирование учащихся школ и педагогического коллектива о проведении праздника Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе	17	03.12.2018	25.12.2018																				
10.8	Приобретение сувениров и материалов для оформления площадки	14	03.12.2018	20.12.2018																				
10.9	Размещение информации о торжественном Закрытии Года детского чтения в Белгородском районе на официальных сайтах администрации района, сельских и городских поселений района	8	20.12.2018	31.12.2018																				
<b>Итого</b>		<b>376</b>	<b>04.05.2018</b>	<b>01.11.2019</b>																				

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
<b>1.</b>	<b>Анализ ситуации в области библиотечного обслуживания детей в Белгородском районе</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Приобретение комплекса библиотечно-информационного обслуживания.</b>	<b>2065,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2065,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения торгов	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Процедура проведения торгов. Заключение контракта.	2050,0	0	0	2050,0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Процедура государственной регистрации КИБО</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Процедура государственной регистрации КИБО	15,0	0	0	15,0	0	0	0
3.2	Формирование плана проведения мероприятий КИБО	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Размещение информации о проекте на сайте управления культуры администрации Белгородского района; социальных группах библиотек Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Организация и проведение цикла выездных мероприятий по обслуживанию детей	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Организация и проведение цикла выездных мероприятий по обслуживанию детей в 3 квартале 2018 года	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Организация и проведение цикла выездных мероприятий по обслуживанию детей в 4 квартале 2018 года	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Приобретение детской литературы</b>	<b>540,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Анализ детского фонда библиотек Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения торгов	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Процедура проведения торгов. Заключение контракта.	540,0	0	0	540,0	0	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
<b>5.</b>	<b>Приобретение оргтехники и компактных планшетных компьютерных устройств</b>	<b>920,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>Приобретение компактных планшетных устройств.</b>	<b>320,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.1	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения процедуры торгов по закупке компактных планшетных устройств	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Проведение процедуры торгов по закупке компактных планшетных устройств	320,0	0	0	320,0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Приобретение компьютерной техники.</b>	<b>600,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1	Анализ ситуации парка компьютерной техники в библиотеках Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения процедуры торгов по закупке ПК	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Проведение процедуры торгов по закупке ПК. Заключение контракта.	600,0	0	0	600,0	0	0	0
5.3	Утверждение списка библиотек, нуждающихся в планшетных устройствах и новых ПК	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Организация мероприятий в рамках Года детского чтения</b>	<b>55,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>
<b>6.1</b>	<b>Проведение районного конкурса «Самая читающая семья Белгородского района!»</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1	Разработка положения конкурса, утверждение состава жюри.	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Проведение и подведение итогов районного конкурса «Самая читающая семья Белгородского района»	5,0	0	0	5,0	0	0	0
<b>6.2</b>	<b>Организация и проведение мероприятия «Страна Литературия»</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.1	Разработка сценария районного праздника, посвященного Дню защиты детей «Страна Литературия»	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Приобретение рамок и грамот для процедуры награждения	24,0	0	0	24,0	0	0	0
6.2.3	Проведение и награждение участников районного праздника, посвященный Дню защиты детей «Страна Литературия»	6,0	0	0	6,0	0	0	0
<b>6.3</b>	<b>Организация и проведение районной акции «Подари ребенку книгу»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3.1	Разработка положения акции и сроков проведения акции	0	0	0	0	0	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
6.3.2	Информирование жителей района о предстоящей акции посредством размещений афиш, информации в сети Интернет, сайте Управление культуры администрации Белгородского района; Вконтакте - группа «Культурное сообщество Белгородского района», Социальных группах библиотек Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3	Проведение акции «Подари ребенку книгу!»	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.4</b>	<b>Организация и проведение акции «Читающий район», посвященной 90-летию со Дня образования Белгородского района.</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>
6.4.1	Разработка положения и сроков проведения акции	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2	Информирование жителей района о предстоящей акции посредством размещений афиш, информации в сети Интернет, сайте Управления культуры администрации Белгородского района, ВКонтакте-группа «Культурное сообщество Белгородского района», группах библиотек Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
6.4.3	Информирование учащихся школ и педагогического коллектива о проведении Интернет - акции, «Читающий район», посвященной 90-летию со Дня образования Белгородского района.	0	0	0	0	0	0	0
6.4.4	Размещение информации о проведении Интернет-акции на сайте Управления образования Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
6.4.5	Приобретение рамок и грамот для процедуры награждения	10, 0	0	0	5,0	0	0	5,0
6.4.6	Проведение и подведение итогов Интернет - акции, «Читающий район», посвященной 90-летию со Дня образования Белгородского района.	0	0	0	0	0	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральны й	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
<b>6.5</b>	<b>Организация и проведение районного фестиваля чтецов «Восславим тебя, Белгородский район!»</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5.1	Информирование жителей района о предстоящей акции посредством размещений афиш, информации в сети Интернет, сайте Управления культуры администрации Белгородского района, Вконтакте- группа «Культурное сообщество Белгородского района», группах библиотек Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
6.5.2	Разработка положения районного фестиваля чтецов «Восславим тебя Белгородский район!»	0	0	0	0	0	0	0
6.5.3	Разработка сценария районного фестиваля чтецов «Восславим тебя Белгородский район!»	0	0	0	0	0	0	0
6.5.4	Сбор заявок на участие в районном фестивале чтецов «Восславим тебя Белгородский район!»	0	0	0	0	0	0	0
6.5.5	Приобретение рамок и грамот для процедуры награждения	5,0	0	0	5,0	0	0	0
6.5.6	Проведение и подведение итогов районного фестиваля чтецов «Восславим тебя, Белгородский район!»	5,0	0	0	5,0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Строительство и торжественное открытие учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)</b>	<b>14000,0</b>	<b>0</b>	<b>12600,0</b>	<b>1400,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Разработка технического задания.	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Разработка проектно-сметной документации.	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Экспертиза проектно-сметной документации	0	0	0	0	0	0	0



# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральны й	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
7.4	Строительные работы во возведению здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	14000,0	0	12600,0	1400,0	0	0	0
7.5	Строительные работы по кровельной отделке здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	0	0	0	0	0	0	0
7.6	Строительные работы по внутренней отделке здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	0	0	0	0	0	0	0
7.7	Ввод в эксплуатацию здания учреждения культуры (Дом культуры и библиотека в с. Зеленая Поляна)	0	0	0	0	0	0	0
7.8	Разработка сценария и проведение литературно-музыкального праздника «Приключения в Солнечном городе» к 110-летию Н. Носова, посвященного торжественному Открытию учреждения культуры.	0	0	0	0	0	0	0
7.9	Организация и проведение литературно-музыкального праздника «Приключения в Солнечном городе» к 110-летию Н. Носова, посвященного торжественному Открытию учреждения культуры.	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Создание базы данных «Современные писатели - детям»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Создание сборника «Детская книга в каждый дом» по итогам проекта</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения торгов	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Процедура проведения торгов. Заключение контракта.	30,0	0	0	30,0	0	0	0
9.3	Набор, верстка и печать сборника «Детская книга в каждый дом» по итогам проекта	0	0	0	0	0	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральны й	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
9.4	Презентация сборника «Детская книга в каждый дом» сотрудникам библиотек Белгородского района по итогам проекта	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Размещение сборника «Детская книга в каждый дом» на сайте МУК «ЦБ Белгородского района» и странице Детской районной библиотеке	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Организация и проведение торжественного Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе</b>	<b>5 278,5</b>	<b>3 938,9</b>	<b>1 047,1</b>	<b>283,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,0</b>
10.1	Приобретение звукоусилительного и светового оборудования для АУК «Майский ДК»	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Сбор и анализ коммерческих предложений для проведения процедуры торгов по закупке звукоусилительного и светового оборудования для АУК «Майский ДК»	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Проведение процедуры торгов звукоусилительного и светового оборудования для АУК «Майский ДК». Заключение контракта.	5 248,5	3 938,9	1,047,1	262,5	0	0	0
10.4	Разработка сценария Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Информирование жителей района о предстоящей акции посредством размещений афиш, информации в сети Интернет, на сайте Управления культуры администрации Белгородского района, Вконтакте в группе «Культурное сообщество Белгородского района», в группах библиотек Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Формирование и утверждение списка награждаемых в рамках Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе	0	0	0	0	0	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральны й	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
10.7	Информирование учащихся школ и педагогического коллектива о проведении праздника Закрытия Года детского чтения в Белгородском районе	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Приобретение сувениров и материалов для оформления площадки	30,0	0	0	21,0	0	0	9,0
10.9	Размещение информации о торжественном Закрытии Года детского чтения на официальных сайтах администрации района, сельских и городских поселений района	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>		<b>22888,5</b>	<b>3938,9</b>	<b>13647,1</b>	<b>5288,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,0</b>

# ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<b>Бюджетное финансирование</b>				
<b>Форма участия</b>		<b>Размер участия бюджета, тыс. руб.</b>		
		<b>Федеральный</b>	<b>Областной</b>	<b>Местный</b>
Прямое бюджетное финансирование	Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»	3 938,9	13 647,1	5 288,5
Дороги	-	0	0	0
Субсидии	-	0	0	0
<b>ИТОГО: 22888,5</b>		<b>3 938,9</b>	<b>13 647,1</b>	<b>5 288,5</b>
<b>Программы государственной поддержки</b>				
<b>Потребность</b>		<b>Финансовые вложения, тыс. руб.</b>		
Электроэнергия	-	0		
Газоснабжение	-	0		
Водоснабжение	-	0		
Гарантии		0		
Залоги		0		
<b>Прочие формы участия:</b>		0		
<b>Земельный участок:</b> территория Белгородского района и города Белгорода				

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1.</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1.	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	116,5 тыс.чел.
1.2.	Новые рабочие места	Ед.	0
1.3.	Средняя з/п	Тыс. руб.	0
1.4.	Месячный ФОТ	Млн. руб.	0
1.5.	Годовой ФОТ	Млн. руб.	0
1.6.	<i>Иные показатели</i>		0
<b>2.</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1.	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	22,888
2.2.	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	0
2.3.	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	0
2.4.	Целевая выработка на одного работника		0
2.5.	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	0
2.6.	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	0
2.7.	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	0
<b>3.</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1.	Годовой объем выручки	Млн. руб.	0
3.2.	Годовой объем прибыли	Млн. руб.	0
3.3.	Рентабельность	%	0
3.4.	Срок окупаемости проекта	Лет	0
3.5.	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	0
3.6.	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	0
3.7.	<i>Иные показатели</i>		0



# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Кулабухова Наталья Александровна	Заместитель главы администрации района – руководитель комитета социальной политики администрации района администрация Белгородского района	Куратор проекта
2.	Калашник Юлия Васильевна	Начальник Управления культуры администрации Белгородского района	Руководитель проекта
3.	Лукашюс Елена Юрьевна	Заместитель начальника Управления культуры администрации Белгородского района	Администратор проекта
4.	Беловолова Валентина Викторовна	Заведующая методико-библиографического отдела МУК «ЦБ Белгородского района»	Оператор мониторинга проекта
5.	Горковенко Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника Управления культуры администрации Белгородского района по экономике, бухгалтерскому учёту и отчётности, главный бухгалтер	Исполнитель проекта
6.	Губарев Владимир Иосифович	Начальник МКУ «Отдел Капитального Строительства Администрации Белгородского района»	Исполнитель проекта
7.	Малышева Марина Дмитриевна	Заместитель руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования Белгородского района	Исполнитель проекта
8.	Сиз Людмила Павловна	Директор МБУК «Районный информационно- методический центр Белгородского района»	Исполнитель проекта
9.	Мишукова Татьяна Ивановна	Методист МБУК «Районный информационно- методический центр Белгородского района»	Исполнитель проекта
10.	Щербакова Татьяна Васильевна	Методист МБУК «Районный информационно- методический центр Белгородского района»	Исполнитель проекта

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
11.	Клыженко Анна Викторовна	Директор МУК «ЦБ Белгородского района»	Исполнитель проекта
12.	Немыкина Юлия Николаевна	Заместитель директора по работе с детьми МУК «ЦБ Белгородского района»	Исполнитель проекта
13.	Кузнецов Александр Юрьевич	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности МУК «ЦБ Белгородского района»	Исполнитель проекта
14.	Потюшко Светлана Борисовна	Директор АУК «Майский ДК»	Исполнитель проекта
15.	Леонова Валентина Ивановна	Заведующий ОК и ОЛ МУК «ЦБ Белгородского района»	Исполнитель проекта
16.	Юркова Надежда Владимировна	Методист методико-библиографического отдела МУК «ЦБ Белгородского района»	Исполнитель проекта
17.	Шурубкина Яна Анатольевна	Методист ведущий Детской районной библиотеки МУК «ЦБ Белгородского района»	Исполнитель проекта

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта:

*Калашник Юлия Васильевна*

тел.: 8 (4722) 38-10-04

e-mail: kulturabelrayon@yandex.ru

Администратор проекта:

*Лукашюс Елена Юрьевна*

тел.: 8 (4722) 39-10-47

e-mail: kulturabelrayon@yandex.ru
